

LĪGUMS LVC2019/2.1.1/3/AC/PA

Rīgā 2019. gada 19. februārīLīguma reģistrācijas numurs 56

Pamatojoties uz 2016. gada 14. decembra deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, **valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”** valdes priekšsēdētāja Jāņa Langes personā un valdes locekļa Edgara Stroda personā, kuri rīkojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un **ceļu būves firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BINDERS”** valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas un valdes locekļa Ingus Pēterona personā, kuri rīkojas pamatojoties uz 2016. gada 11. augusta ierakstu komercreģistrā par pārstāvības tiesībām (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz 2018. gada 27. februāra Vispārīgo vienošanos LVC2017/141/AC/PA (iepirkuma identifikācijas Nr. LVC2017/141/AC) un paziņojumu par rezultātiem uzaicinājumam Nr. 14, noslēdz šādu būvdarbu līgumu:

1. Definīcijas

- 1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
- 1.2. Būvprojekts šī līguma izpratnē ir nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas sagatavots šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai (Līguma 3. pielikums “Defektu akti/ Skaidrojošie apraksti”).
- 1.3. Dienas ir kalendārās dienas.
- 1.4. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
- 1.5. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.
- 1.6. Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu uzraudzību.
- 1.7. Būvuzraugs ir Būvinženiera pārstāvis, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 1.8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būves vietā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 1.9. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.
- 1.10. Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums ir Būvinženiera apstiprināts visu projektā paredzēto būvdarbu ziemas sezonas pārtraukums būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt *valsts reģionālā autoceļa P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi) posma km 28,854-35,300 un posma km 48,100-55,832 seguma atjaunošanu* (turpmāk – Darbs) līgumā noteiktajā termiņā.
- 2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:

- | | |
|--|---------------|
| 2.2.1. Šis līgums. | 1. pielikums. |
| 2.2.2. Līguma dati | 2. pielikums. |
| 2.2.3. Specifikācijas | 3. pielikums. |
| 2.2.4. Defektu akti, Skaidrojošie apraksti, Shēmas un Rasējumi | 4. pielikums. |
| 2.2.5. Darbu daudzumu saraksti | 5. pielikums. |
| 2.2.6. Būvdarbu garantijas noteikumi | 6. pielikums. |
| 2.2.7. Finanšu garantiju noteikumi | 7. pielikums. |
| 2.2.8. Piedāvājums | |
- 2.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja līguma 2. pielikumā „Specifikācijas” (turpmāk – Specifikācijas) nav noteikts citādi.

3. Darba izmaiņas

- 3.1. Šis ir vienības cenu līgums – Darbu daudzumu sarakstā norādītie darbu daudzumi ir aptuveni, un atbilstoši būvprojektam veicamā darba faktiskais apjoms var atšķirties no Darbu daudzumu sarakstā paredzētā, tomēr faktiski paveiktais apjoms, ieskaitot saskaņā ar 3.2. punktu uzdotās izmaiņas, nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 5 (pieciem) %.
- 3.2. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu būves atbilstību Būvprojekta mērķim, Pasūtītājs drīkst izmainīt Būvprojektu un noteikt ar Būvprojekta izmaiņām saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus:
- 3.2.1. par Būvprojekta izmaiņām Būvinženieris sagatavo izmaiņu aktu sistēmā BUVIS un izsniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos;
- 3.2.2. Būvprojekta izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs (saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo procedūru „Būvdarbi”), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā un Izpildītāja iesniegtās un Būvinženiera saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Būvinženiera saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos;
- 3.2.3. Būvprojekta izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:
- 3.2.3.1. izmaiņas nedrīkst kāda Darbu daudzumu sarakstā sākotnēji paredzēta darba apjomu mainīt vairāk par 30 (trīsdesmit) %, ja tā dēļ Darba cena mainās vairāk par 2 (diviem) % no līgumcenas;
- 3.2.3.2. izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu daudzumu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no līgumcenas;
- 3.2.3.3. izmaiņām nepieciešamais kopējais Darba pabeigšanas termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) dienas;
- 3.2.3.4. kopējās Būvprojekta izmaiņas nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 4,5 (četriem komats pieciem)%;
- 3.2.4. izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam. Izmaiņu akts ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
- 3.3. Par darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

4. Līgumcena

- 4.1. Līgumcena ir 332 045,60 EUR (trīs simti trīsdesmit divi tūkstoši četrdesmit pieci *euro* un 60 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir 69 729,58 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi *euro* un 58 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 401 775,18 EUR (četri simti viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit pieci *euro* un 18 centi).

4.2. Līgumcēnā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

5. Darba izpildes laiks

- 5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1. pielikumā „Līguma dati” vēlākajā norādītajā termiņā.
- 5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1. pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no faktiskā uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot ziemas tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu aktu atbilstoši līguma 3. sadaļas prasībām.
- 5.3. Līguma 1. pielikumā „Līguma dati” minēto dienu laikā Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par satiksmes organizēšanu un būves vietas uzturēšanu. Izpildītājs drīkst saņemt būves vietu pa daļām. Būves vietu Izpildītājs izmanto tikai šī līguma izpildei, tajā nedrīkst atrasties ar izbūvējamo objektu nesaistītu materiālu krautnes.
- 5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
 - 5.4.1. termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Pasūtītājs liedz piekļušanu būves vietai pēc līguma 1. pielikumā "Līguma dati" noteiktā termiņa, Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ), kā arī ja līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma (kuru Pasūtītājs noslēdzis ar citu piegādātāju) izpildes kavējumu vai pārkāpumu;
 - 5.4.2. izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas varas dēļ, vai tai ir cits objektīvs no Izpildītāja gribas neatkarīgs iemesls, kuru Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst;
 - 5.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apstiprina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienesta izziņa.

6. Būvdarbu garantija

- 6.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 6. pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” pievienotajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, izņemot līguma 6. pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 6.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 4. pielikumā noteiktā Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 6.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līguma 13.7. punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

- 7.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvinženierim, Būvuzraugam un to palīgiem darba apstākļus, kas ir līdzvērtīgi Izpildītāja inženiertehnisko darbinieku darba apstākļiem.

- 7.2. Atbilstoši līguma 1. pielikumā „Līguma dati” norādītajai vasaras un ziemas uzturēšanas klasei un Specifikācijās norādītajam apjomam Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar Būvdarbu pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam.
- 7.3. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam.
- 7.4. Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ. Tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz autoceļa īpašnieka rēķina. Lai uz ziemas uzturēšanas periodu nodotu autoceļu vai tā posmu autoceļa īpašniekam, Izpildītājam jāievēro šādi nosacījumi:
 - 7.4.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi;
 - 7.4.2. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu.
- 7.5. Izpildītājs ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Darbu atsākšanas pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma beigām informē Pasūtītāju.
- 7.6. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1. šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:
 - 7.6.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu;
 - 7.6.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.

8. Darbu veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes

- 8.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darbu veikšanas projektu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darbu veikšanas projektu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
- 8.2. Darbu veikšanas projektu, tā papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvinženeri. Bez Būvinženiera apstiprināta Darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
- 8.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvinženieris, Būvuzraugs un Projekta vadītājs, ja nepieciešams – arī citi Izpildītāja vai Pasūtītāja norīkoti pārstāvji. Būvinženieris vada Darba vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
- 8.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauca ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
- 8.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darbu veikšanas projekta un tā papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas un citus jautājumus.

9. Sadarbība

- 9.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvinženeri.
- 9.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
- 9.3. Būvinženiera veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi.
- 9.4. Izpildītājs brīdina Būvinženeri un Projekta vadītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja

- uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu, zaudējumus vai izvairītos no tiem.
- 9.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu grozījumiem vai Darba izmaiņām, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvinženierim par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas un veicis visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu kaitējumu un zaudējumus vai izvairītos no tiem.
 - 9.6. Izpildītājs, saskaņojot ar Būvinženieri, uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
 - 9.7. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 9.7.1. atkārtota pavisā savu pienākumu pildīšana;
 - 9.7.2. nekompetence vai nolaidība;
 - 9.7.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
 - 9.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
 - 9.8. Būvinženierim un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
 - 9.9. Projekta vadītājam, Būvinženierim un/vai Būvuzraugam, Pasūtītāja Autoceļu kompetences centra pārstāvjiem, kā arī citiem Pasūtītāja pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties būvlaukumā, jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Par ierašanos būvlaukumā un ražotnē (ražošanas procesa laikā) iepriekš nav jābrīdina. Pārējos gadījumos jābrīdina vismaz sešas stundas iepriekš, izmantojot katrā konkrētajā gadījumā efektīvāko saziņas līdzekli (telefons, internets, fakss). Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
 - 9.10. Projekta vadītājs un Būvinženieris atbild uz Izpildītāja iesniegumiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
 - 9.11. Izpildītājs nodrošina, ka asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā, un tam jābūt fiksētam būvdarbu žurnālā.
 - 9.12. Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo un darbu izpildē lieto būvdarbu žurnālu atbilstoši Pasūtītāja noteiktām vadlīnijām un izstrādātām veidlapām (<http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem#buvdarbu-izpilditajiem>).
 - 9.13. Izpildītājs būvdarbu izpildedokumentācijas sistematizēšanai un nodošanas kārtībai Pasūtītājam, lieto Pasūtītāja noteiktās vadlīnijas (<http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem#buvdarbu-izpilditajiem>).
 - 9.14. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītāja Satiksmes informācijas centram pa diennakts tālruni nr.80005555 vai elektroniskajā pastā sic@lvceli.lv un Projekta vadītājam par krīzes situācijām, kuru dēļ satiksme objektā bloķēta, apturēta vai stipri apgrūtināta.
 - 9.15. Satiksmes organizācijas izmaiņu gadījumā vietās, kur izvietotas stacionārās braukšanas ātruma kontroles ierīces (fotoradari), Izpildītājam vismaz vienu nedēļu pirms, bet ārkārtas gadījumos – ne vēlāk kā izmaiņu izdarīšanas brīdī, jāinformē Ceļu satiksmes drošības direkcija elektroniskajā pastā csdd@csdd.lv, bet ārkārtas gadījumos – pa tālruni nr.67025750, norādot veicamās izmaiņas satiksmes organizācijas shēmas veidā, to ieviešanas (un atcelšanas) datumu un laiku.

10. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaīņa

- 10.1. Ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tāds plānots iesaistīt) sarakstu,

kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs nekavējoties paziņo Projekta vadītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

- 10.2. Izpildītājs nodrošina, ka būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Būvinženiera, Projekta vadītāja, Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.
- 10.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku vai nomaīņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaīņas jāiesniedz Projekta vadītājam Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanai uz laiku vai nomaīnai, ja piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir tiesīgs veikt būvdarbu vadīšanu.
- 10.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaīņu, pamatojoties uz līguma 9.7. punktu, tad Izpildītājam pēc nomaīņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Projekta vadītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.
- 10.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaīņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kuram plānots nodot vismaz 10 (desmit) % no kopējās līguma vērtības vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kuram plānots nodot vismaz 10 (desmit)% no kopējās līguma vērtības, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu – darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaīnai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā, vai ir iestājušies likuma 42. panta trešajā daļā noteiktie noilguma termiņi. 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaīņu iesniegts Pasūtītājam.
- 10.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaīņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu – darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.
- 10.7. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēju nomaīnai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma

izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darba dienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

10.8. Asfaltbetona ražotāja maiņa ir atļauta tikai ar Projekta vadītāja apstiprinātu Būvinženiera lēmumu.

11. Kvalitāte un pārbaudes

- 11.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Būvprojektā.
- 11.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.3. punktā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
- 11.3. Pasūtītājs pēc pēdējās bitumenizētās asfaltbetona kārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu.
- 11.4. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Būvinženiera noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem to novērš. Ja Pasūtītājs secina, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs var piemērot šādus preventīvus pasākumus, kas var tikt piemēroti visi kopā vai jebkurā to kombinācijā, vai arī tikai viens no tiem: noteikt Darbam samazinātu cenu atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam, noteikt būves defekta posmam ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību, noteikt defekta posmam veicamo pasākumu kopumu kā papildu garantijas saistības, kas Izpildītājam jāveic, neatkarīgi no defekta rašanās cēloņa.
- 11.5. Ja pārbaudes laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic un defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa. Par eksperta kandidatūru puses savstarpēji rakstveidā vienojas 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgās puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja šajā punktā norādītajā termiņā puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs. Eksperta atzinumu puses uzskatīs sev par saistošu. Ar eksperta pieaicināšanu saistītās izmaksas puses sedz vienādās daļās.

12. Paveiktā Darba pieņemšana

12.1. Paveiktā Darba pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

13. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 13.1. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina:
 - 13.1.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu;
 - 13.1.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.
- 13.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 1. pielikumā „Līguma dati” norādītajā apmērā no līgumcenas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 7. pielikuma „Finanšu garantiju noteikumi” prasībām:
 - 13.2.1. Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk;
 - 13.2.2. Avanss jāatmaksā ne vēlāk kā 28 dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām. Ja avanss netiek atmaksāts līgumā noteiktajā termiņā vai avansa garantija nav pagarināta, Pasūtītājam ir tiesības prasīt nokavējuma procentus 0,05 (nulle

komats nulle piecu) % apmērā no neatmaksātā avansa par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no avansa apmēra;

- 13.2.3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam pamatojumu apliecinājuma veidā, ka avanss izlietots sākotnējo izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai.
- 13.3. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 1. pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, bet ievērojot šādus ierobežojumus:
- 13.4. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas. Aktu Izpildītājs noformē Pasūtītāja datorprogrammā BUVIS (www.lvceli.lv/buvis). Būvinženieris pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvinženiera apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – Samaksas dokumenti).
- 13.5. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs	LR Satiksmes ministrija
Reģistrācijas Nr.	90000088687
PVN maksātāja Nr.	LV90000088687
Adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1743
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV62TREL2170389081000

- 13.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas. Pēdējā aktā par izpildīto Darba daļu Izpildītājs drīkst veikt atlikušo un iztrūkstošo darbu apjomu ieslēgšanu un/vai izslēgšanu, lai līguma kopējā atlikušo darbu bilance pēc būvdarbu pabeigšanas būtu „0”.
- 13.7. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur līguma 1. pielikumā „Līguma dati” norādīto ieturējuma naudu (turpmāk – Ieturējuma nauda). Puses piemēro šādu Ieturējuma naudas izmantošanas kārtību:
- 13.7.1. 50 (piecdesmit) % no Ieturējuma naudas Izpildītājs saņem pēc Gala novērtējuma akta (*Pasūtītāja apstiprināta veidlapa*) parakstīšanas;
- 13.7.2. 50 (piecdesmit) % Ieturējuma naudas Izpildītājs saņem pēc līguma 6. nodaļā „Būvdarbu garantija” un 5. pielikumā „Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktā maksimālā garantijas termiņa beigām, izņemot nākamajā apakšpunktā noteikto gadījumu;
- 13.7.3. iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu Izpildītājam, ar Pasūtītāju vienojoties, ir tiesības aizstāt ar garantijas laika garantiju. Šādā gadījumā Pasūtītājs iepriekšējā apakšpunktā noteikto Ieturējuma naudas daļu pilnā apmērā pārskaita Izpildītājam.
- 13.8. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 13.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajos aktos par izpildīto Darba daļu.
- 13.10. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa atgriešanu, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, puses veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta

parakstīšanas, izņemot līguma 13.7. punktā noteikto Ieturējuma naudu līdz garantijas termiņa beigām.

14. Darba aizsardzība un apdrošināšana

- 14.1. Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, veic iepriekšēju paziņojumu Valsts darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu, ja to nosaka normatīvie akti. Līdz Darba uzsākšanai Izpildītājs izstrādā darba aizsardzības plānu. Ja nepieciešamā informācija ir iekļauta citos būvniecības dokumentos vai būvprojekta rasējumos, darba aizsardzības plānā var būt tikai norādes uz vietu, kur var atrast informāciju.
- 14.2. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs noslēdz atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu, un nodrošina tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
- 14.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darba sākšanas.
- 14.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas laikā.

15. Līguma izpildes spējas garantija

- 15.1. Izpildītājam nav jāiesniedz līguma izpildes spēju garantija.

16. Līgumsods

- 16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu)% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas.
- 16.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no galvenās saistības apmēra – līguma 4.1. punktā noteiktās objekta līgumcenas.
- 16.3. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 200 (divi simti) *euro* apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) *euro* apmērā.
- 16.4. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 200 (divi simti) *euro* apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) *euro* apmērā.

- 16.5. Par Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 200 (divi simti) *euro* apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) *euro* apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000 (viens tūkstošis) *euro* apmērā.
- 16.6. Izbeidzot šī līguma darbību vai atkāpjoties no līguma pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas (atkāpšanās) iniciators, maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas.
- 16.7. Ja līguma 10.5. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai apakšuzņēmēja, kuram plānots nodot vismaz 10 (desmit)% no kopējās līguma vērtības, maiņas ierosinājumu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kuram plānots nodot vismaz 10 (desmit)% no kopējās līguma vērtības, piesaistīšanas pieteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 300 (trīs simti) *euro* par katru gadījumu.
- 16.8. Ja saskaņā ar līguma 10.8. punktu Izpildītājs neiesniedz ierosinājumu asfaltbetona ražotāja maiņai, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 1000 (viens tūkstošis) *euro* apmērā.
- 16.9. Ja Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu pret līdzvērtīgu līgumā noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 10 000 (desmit tūkstoši) *euro* apmērā.
- 16.10. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100 (simts) *euro* par katru gadījumu.

17. Līguma grozīšana

- 17.1. Ja iestājas kāds no līguma 5.4. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas termiņš.
- 17.2. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

18. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana

- 18.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
- 18.1.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma vai Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
- 18.1.2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
- 18.1.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;
- 18.1.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
- 18.1.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
- 18.1.6. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu kopsumma pārsniedz 0,2 (nulle komats divi) % no līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas, ja Izpildītājs nenodrošina uzaicinājumā noteiktajām kvalifikācijas

- prasībām atbilstošu būvdarbu vadītāju objektā un Pasūtītājs atkārtoti piemērojis līguma 16.7.punktā paredzēto līgumsodu, Izpildītājs atkārtoti, bez saskaņošanas vai neinformējot Pasūtītāju šajā līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Darba daļas izpildi apakšuzņēmējam;
- 18.1.7. Izpildītājs līguma 14.nodaļā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus saskaņā ar līguma 14.3.punkta noteikumiem;
- 18.1.8. Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu līguma 10.5. un 10.6.punktā noteiktajā kārtībā, un par vismaz vienu no šiem pārkāpumiem ir piemērots līgumsods. Šajā punktā minētajā gadījumā nav jāiestājas nevienam no līguma 18.1.6.punktā minētajiem nosacījumiem;
- 18.1.9. Izpildītājs nenodrošina tāda uzņēmēja (tai skaitā apakšuzņēmēja) resursu pieejamību līguma izpildes vajadzībām, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai pierādītu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā;
- 18.1.10. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
- 18.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:
- 18.2.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līguma 4.1. punktā noteiktās līgumcenas;
- 18.2.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu;
- 18.3. Līgums var tikt izbeigts, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
- 18.4. Atkāpšanās no līguma vai līguma izbeigšanas gadījumā:
- 18.4.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
- 18.4.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu atsākšanai vai 9 (deviņus) mēnešus pēc darbu pabeigšanas. Uzdevumu sagatavo, ievērojot līguma 3.2.punkta noteikumus;
- 18.4.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
- 18.4.4. pēc visu darbu pabeigšanu puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
- 18.4.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus līguma 18.4.2.punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam;
- 18.4.6. ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 16.6.punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 18.4.2.punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;
- 18.4.7. pēc izpildedokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas puses paraksta Būvdarbu pabeigšanas aktu.
- 18.5. Pusei ir tiesības atkāpties no līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

- 18.6. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15 (piecpadsmītajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.
- 18.7. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

19. Fizisko personu datu aizsardzība

- 19.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
- 19.2. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
- 19.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
- 19.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
- 19.5. Neskatoties uz līguma 19.3. punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
- 19.6. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

20. Nepārvarama vara

- 20.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai zaudējumu atlīdzību, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
- 20.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
- 20.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
 - 20.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
 - 20.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
 - 20.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
- 20.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību,

rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

21. Citi noteikumi

- 21.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
- 21.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 21.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 13 (trīspadsmit) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti 7 (septiņi) pielikumi.

22. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	CBF SIA “BINDERS”
Reģistrācijas Nr.	40003344207	40003164644
Juridiskā adrese	Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV 1050	Smilšu ielā 10-104, Rīgā, LV 1050

Pušu paraksti:

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs
J. Lange

valdes loceklis
E. Strods

Izpildītājs
CBF SIA „BINDERS”
valdes priekšsēdētājs
A. Sēja

valdes loceklis
I. Pētersons

Vīzas:

Būvniecības pārvaldes direktors

G. Alberiņš

Līgumu daļas vadītāja

S. Valnere

Finanšu vadības daļas vadītājs

G. Augstkalns

Iepirkumu daļas juriste

L. Bračiņa

Līgumu daļas programmu vadītāja

M. Straustiņa

Iepirkumu daļas projektu vadītāja

K. Derringa

LĪGUMA LVC2019/2.1.1/3/AC/PA PIELIKUMI

	lapa (no – līdz)
1. pielikums „Līguma dati”	15
2. pielikums „Specifikācijas”	16 – 17
3. pielikums „Defektu akts Skaidrojošie apraksti, Shēmas un Rasējumi”	18 – 36
4. pielikums „Darbu daudzumu saraksts”	37 – 38
5. pielikums „Būvdarbu garantijas noteikumi”	39 – 40
6. pielikums „Finanšu garantiju noteikumi”	41 – 42
7. pielikums „Piedāvājums”	43 – 44

LĪGUMA LVC2019/2.1.1/3/AC/PA
1. pielikums LĪGUMA DATI

Objekta nosaukums	Būvdarbu izpildes termiņš		Būvlaukuma pieejamība	Uzturēšanas klase	Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība		
	Uzsākšanas datums	Darba izpildes termiņš			Avanss	Maksājumu termiņš	Ieturējuma nauda
1. Valsts reģionālā autoceļa P17 Valmierā – Rūjiēna – Igaunijas robeža (Unguriņi) posma km 28,854-35,300 seguma atjaunošana	līguma 5.1. punkts	līguma 5.2. punkts	līguma 5.3. punkts	Līguma 7.2. punkts	līguma 13.2. punkts	līguma 13.3. punkts	līguma 13.7. punkts
Valsts reģionālā autoceļa P17 Valmierā – Rūjiēna – Igaunijas robeža (Unguriņi) posma km 48,100-55,832 seguma atjaunošana	28 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai ne vēlāk kā 2019. gada 15. maijā atkarībā no tā, kurš no termiņiem iestājas vēlāk	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		60 dienas	15 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas	A	ne vairāk kā 20% no līgumcenas	30 dienas	10% apmērā no izpildīto darbu izmaksām
				C			


Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs
J.Lange

valdes loceklis
E.Strods



Izpildītājs
CBF SIA „BINDERS”
valdes priekšsēdētājs
A. Sēja

valdes loceklis
L.Pētersons

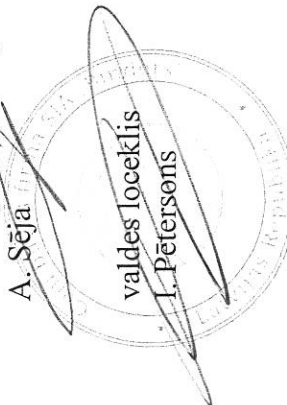

BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI (atjaunošanas objektiem)

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi (būvdarbi), kā arī iekārtas, sistēmas un izmantotie materiāli saglabās kvalitātes, drošuma un pielietojuma īpašības šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs būs izpildījis šo noteikumu 5.nodaļā noteiktās saistības.
- 1.2. Šajos noteikumos noteikto garantijas saistību ietvaros Izpildītājs atbild tikai par tiem Darbu defektiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, nekvalitatīvi un līguma noteikumiem neatbilstoši veicot Darbus un/vai izmantojot līguma un Darbu veikšanu reglamentējošu dokumentu prasībām neatbilstošus materiālus.
- 1.3. Darbu kvalitātes garantijas saistības attiecas tikai uz izpildītiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem.

2. Garantijas periods

- 2.1. Darbu kvalitātes garantijas termiņš sākas no Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- 2.2. Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, izņemot šo noteikumu 2.3.punktā noteikto.
- 2.3. Atsevišķām Darbu daļām tiek noteikts šāds kvalitātes garantijas termiņš:

Nr. p.k.	Darbu daļa	Darbu daļas kvalitātes garantijas termiņš
1.	aukstie un karstie plastikāti horizontāliem ceļu marķējumiem	2 gadi
2.	nogāžu noturība pret izskalojumiem	2 gadi
3.	koka konstrukciju aizsardzības pārklājumi	2 gadi
4.	ierīces, iekārtas	ražotāja noteiktais garantijas termiņš

3. Izņēmumi

- 3.1. Darbu kvalitātes garantija neattiecas uz:
 - 3.1.1. ierīču detaļām, materiāliem, kuri pakļauti normālam nolietojumam ekspluatācijas gaitā (spuldzītes, drošinātāji, krāsotie horizontālie ceļu marķējumi u.c.);
 - 3.1.2. ierīču, konstrukciju un materiālu bojājumiem, kuri nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
 - 3.1.3. mehāniskajiem un ķīmiskajiem bojājumiem, kas radušies nevērīgas vai neatbilstošas apkalpošanas un ekspluatācijas dēļ;

3.1.4. defektiem, kas radušies būvprojekta nepilnību dēļ, bet Pasūtītājs nav nodrošinājis šo nepilnību novēršanu un Darbi ir pabeigti atbilstoši nepilnīgajam būvprojektam.

3.2. Saistībā ar šo noteikumu 3.1.4. punktā noteikto izņēmumu Izpildītājs Būvdarbu pabeigšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdī Pasūtītājam iesniedz Darba daļu sarakstu, kas pabeigti atbilstoši nepilnīgajam projektam vai projekta daļām un par ko Izpildītājs Pasūtītāju ir rakstveidā informējis Darbu veikšanas laikā. Izpildītājam ir pienākums šī saraksta pielikumā pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina Pasūtītāja informēšanas faktu.

4. Garantijas laika apkalpošana

4.1. Ja šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā tiks konstatēti Darba defekti, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs apņemas tos novērst šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Izpildītājam ir pienākums Darba defektus novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 14 (četrpadsmit) dienas, izņemot gadījumus, kad defekti apdraud satiksmes drošību vai ceļa konstrukcijas saglabāšanu. Pusēm vienojoties šis termiņš var tikt pagarināts, jo īpaši tad, ja defektu novēršanai nepieciešamo materiālu piegādi nodrošina Izpildītāja apakšuzņēmēji un/vai defektu novēršana nav iespējama nepiemēroto laika apstākļu dēļ.

4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērs defektus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt trešās personas defektu novēršanai un šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt visus ar to saistītos pamatotos izdevumus. Šo defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājam ir tiesības izmantot līguma 13.7. punktā noteikto Ieturējuma naudu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu trešajām personām Pasūtītājam ir pienākums vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināt Izpildītāju.

5. Pasūtītāja pienākumi garantijas periodā

5.1. Garantijas periodā ir jānodrošina Objekta uzturēšana un ekspluatācija atbilstoši Objekta tehniskajiem parametriem, lai neradītu defektus, kuri var iespaidot autoceļa ekspluatācijas laiku. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam informāciju par Objekta uzturēšanā izmantotajām tehnoloģijām un ierīcēm.

5.2. Ja Pasūtītājs, patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, garantijas periodā Objektā veic jebkādus pārbūves un citus darbus, Pasūtītājam ir pienākums par to rakstveidā informēt Izpildītāju.


Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs
J.Lange

valdes loceklis
E.Strods



Izpildītājs
CBF SIA „BINDERS”
valdes priekšsēdētājs
A. Sēja

valdes loceklis
I. Pētersons

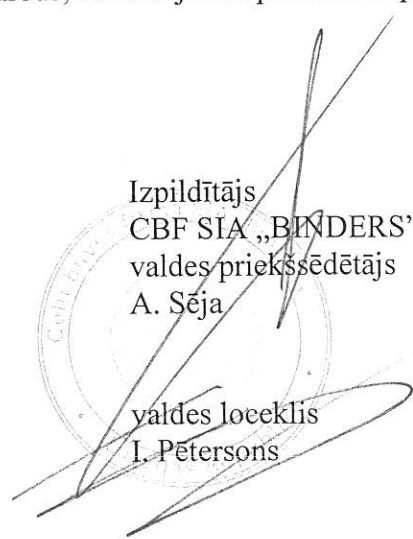

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamus nosacījumus un noteikumus:

1. Avansa garantijai

1.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

- 1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
- 1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
- 1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.

1.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

- 1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
- 1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
- 1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
- 1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
- 1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
- 1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
- 1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

2. Garantijas laika garantijai

2.1. ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

- 2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
- 2.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

- 2.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci.
- 2.2. **Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:**
- 2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
- 2.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
- 2.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
- 2.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
- 2.2.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Pasūtītājs
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētājs
J.Lange

valdes loceklis
E.Strods



Izpildītājs
CBF SIA „BINDERS”
valdes priekšsēdētājs
A. Sēja

valdes loceklis
I. Pētersons

